


Руководитель  
регионального проекта —  
Сотникова Вилена Юрьевна

  
(подпись)

ОДОБРЕН

---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

*"(A2-49) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новгородская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		--		
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	--	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


## 2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	1	1	1	1	1	1	100,00%	
2		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица	70	70	70	70	203	203	34,48%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах повышения квалификации (Новгородская область)" Иное Министерства культуры Новгородской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл.
3		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	56	56	77	98	109	103	54,37%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС Добровольцы России" Иное Министерства культуры Российской Федерации от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

 Отсутствие отклонений







 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	 2  1
2		Жители Новгородской области приняли участие в программе "Волонтеры культуры"	 1  1


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


## 5. Динамика достижения контрольных точек


## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Жители Новгородской области приняли участие в программе "Волонтеры культуры" Значение: 103, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС Добровольцы России" Иное Министерства культуры Российской Федерации от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 56 из 103.
1.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	10.06.2020	09.01.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении рекомендаций по взаимодействию с добровольческими (волонтерскими) организациями и организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности" Иное Министерства культуры Новгородской области от 18.12.2019г. №КК-3214-И, приложен файл.
1.1.1	РРП		Информирование заинтересованных лиц о возможности принять участие в мероприятиях программы "Волонтеры культуры"	10.06.2020	09.01.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении рекомендаций по взаимодействию с добровольческими (волонтерскими) организациями и организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности" Иное Министерства культуры Новгородской области от 18.12.2019г. №КК-32-14-И, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	05.07.2020	05.07.2020	Сотникова В. Ю.	В работе. Отсутствие отклонений


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РРП		Подготовка заявки в "Роскультпроект" с информацией о составе, сроках и маршруте движения группы волонтеров к месту мероприятия	15.06.2020	15.06.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.
2			<i>Проведена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов Значение: 140, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 140.
2.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.06.2020	07.02.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализуемых в 2020 году Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры дополнительных профессиональных образовательных программах – программах повышения квалификации" Иное Министерства культуры Новгородской области от 07.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Подготовлено информационное письмо о возможности повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	27.03.2020	07.02.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализуемых в 2020 году Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры дополнительных профессиональных образовательных программах – программах повышения квалификации" Иное Министерства культуры Новгородской области от 07.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2.2	РНП		Документ утвержден (подписан)	30.03.2020	30.03.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график проведения доп.проф.программ повышения квалификации на 2020 год" Иное ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный институт культуры" от 27.02.2020г. №б/н, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Утверждение плана-графика проведения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по Государственному заданию в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2020 году	30.03.2020	30.03.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график проведения доп.проф.программ повышения квалификации на 2020 год" Иное ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный институт культуры" от 27.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2.3	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.04.2020	30.04.2020	Сотникова В. Ю.	В работе. Отсутствие отклонений
2.3.1	РРП		Направление заявки, содержащей реестр лиц, проходящих повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов в текущем году.	30.04.2020	30.04.2020	Сотникова В. Ю.	В работе. Отсутствие отклонений


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек

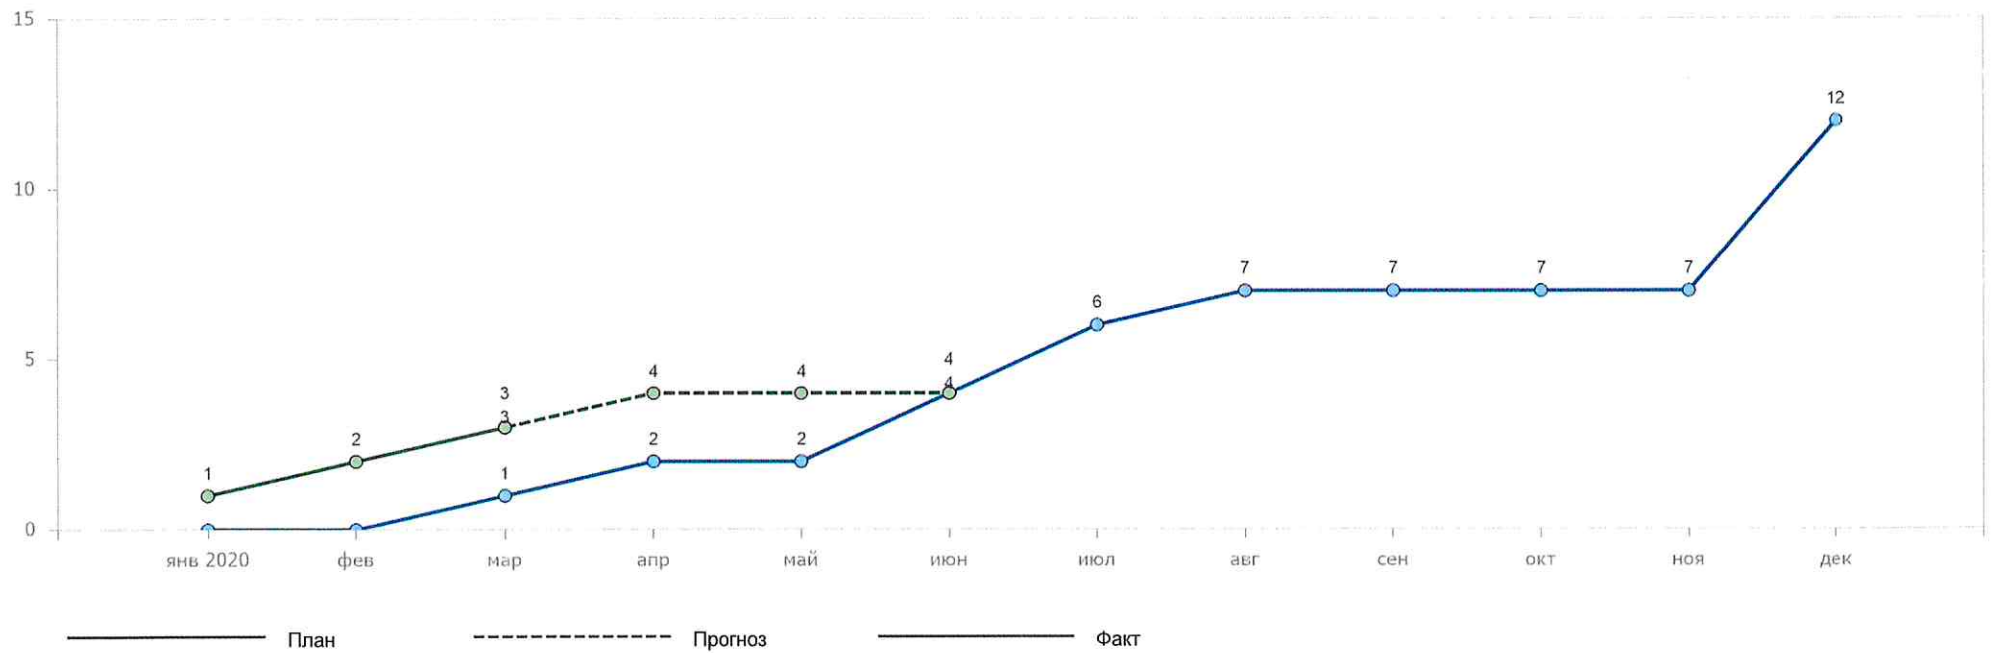


Рис. 1. "(A2-49) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новгородская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



График достижения показателя

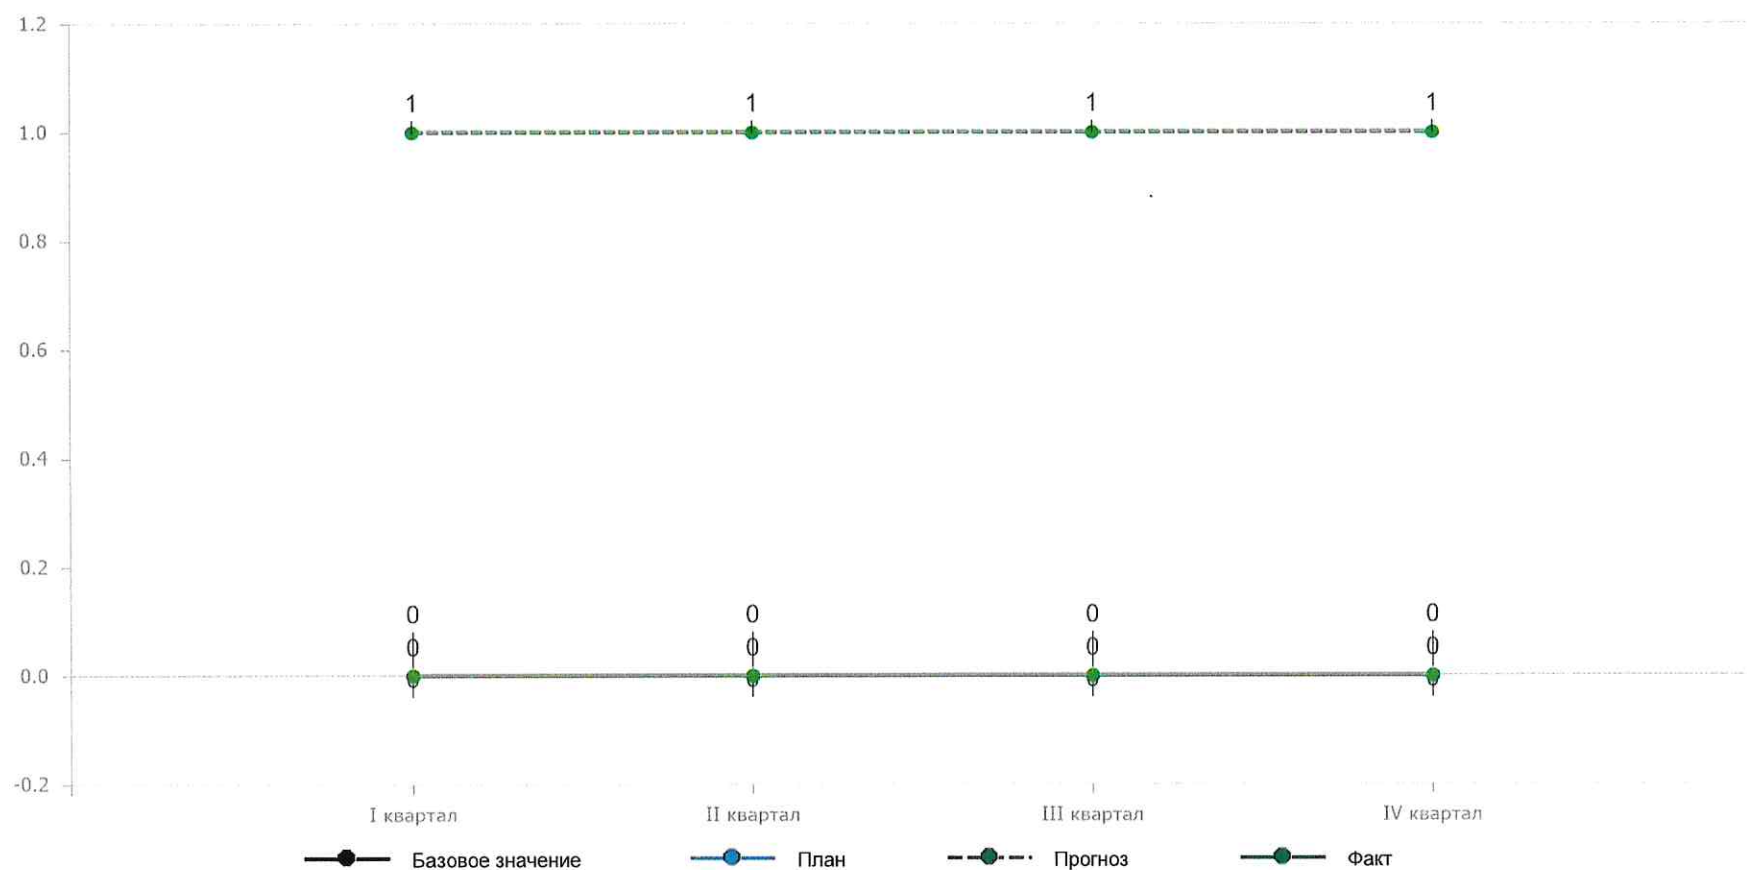


Рис. 1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя

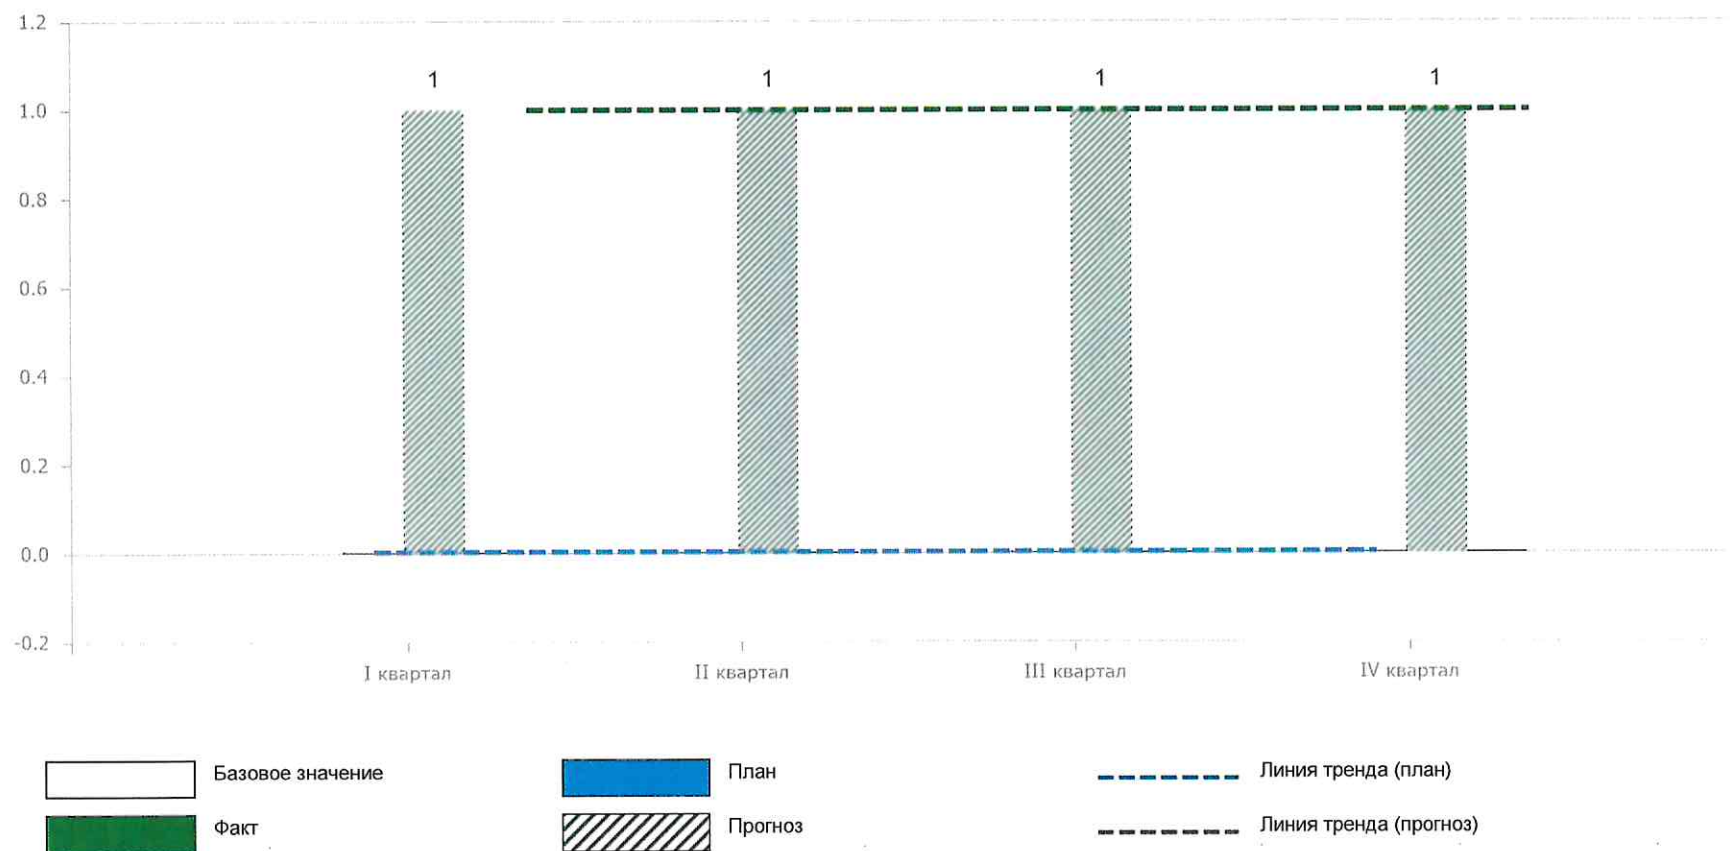


Рис. 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя

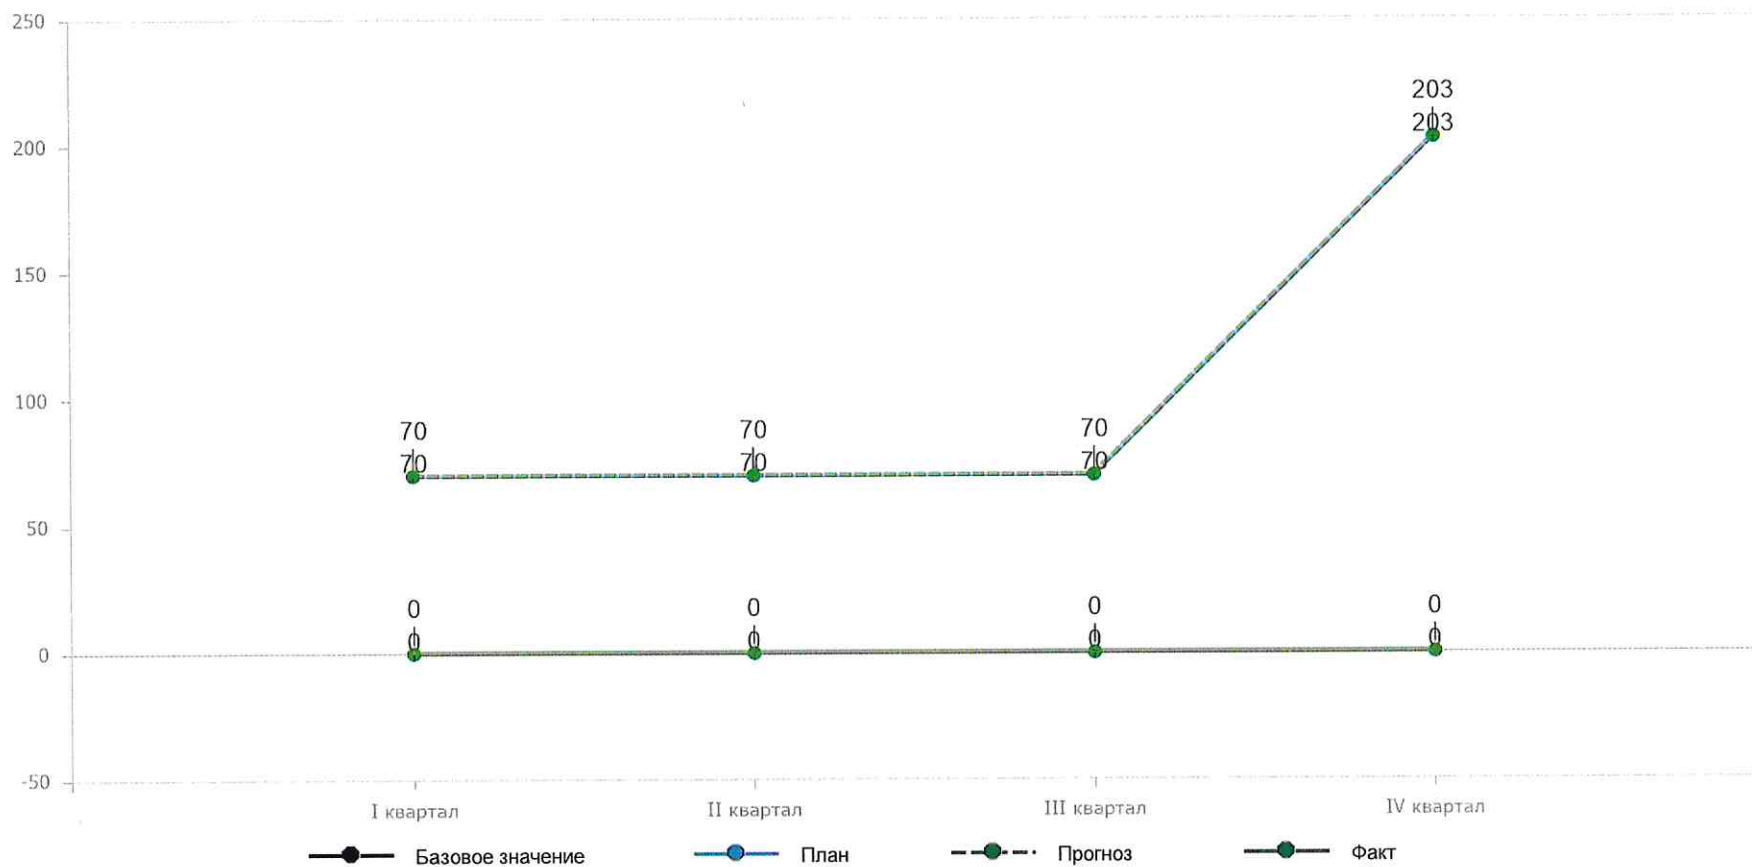


Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

Диаграмма достижения показателя

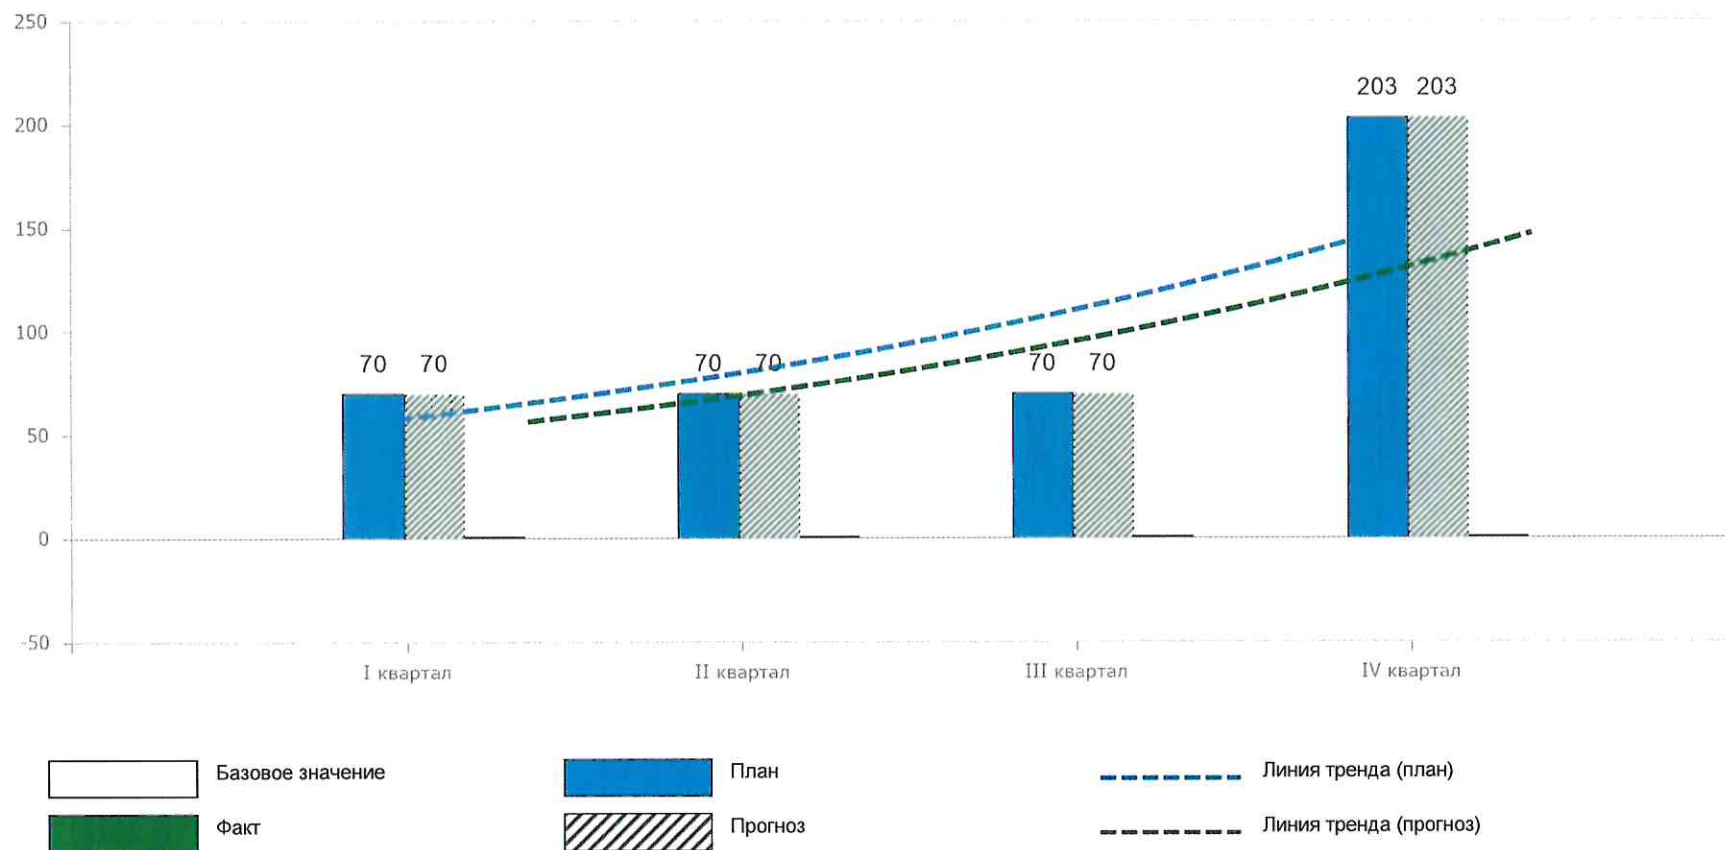


Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

График достижения показателя

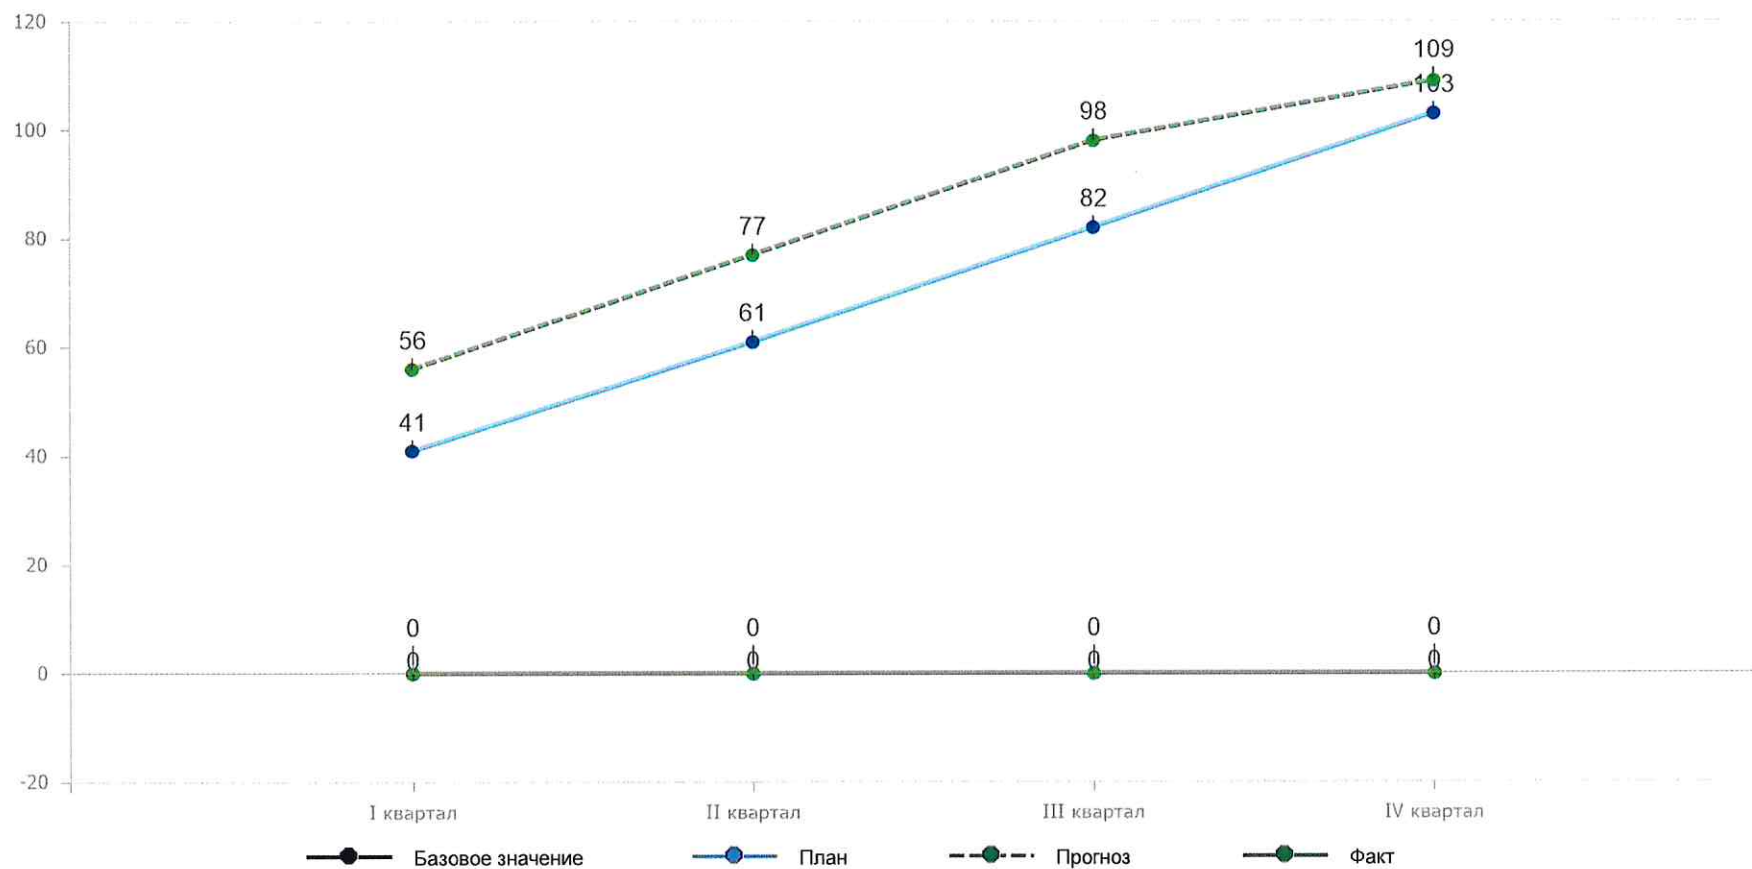


Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)



Диаграмма достижения показателя

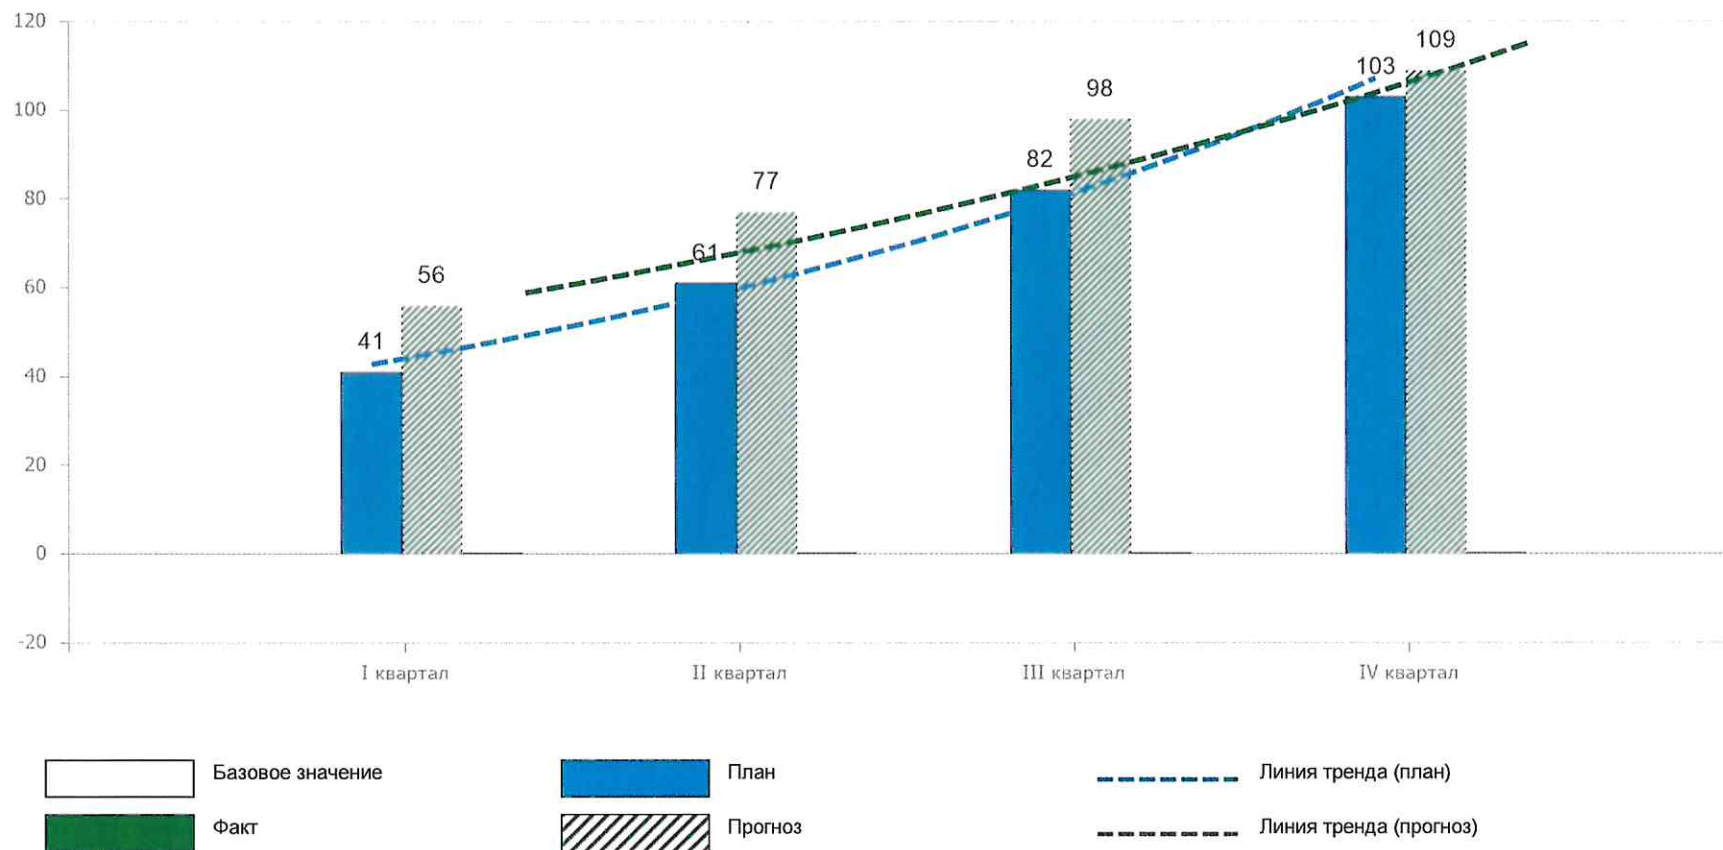


Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
