

Руководитель
регионального проекта —
Сотникова Вилена Юрьевна


(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(А3-49) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская область)"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	3	3	3	6	9	3	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о создании виртуальных концертных залов в городах Новгородской области в 2020 году" Иное Министерства культуры Новгородской области от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 4 700,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены





Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы виртуальные концертные залы	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	данные СБР
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	данные СБР
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы виртуальные концертные залы	 2  1


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Созданы виртуальные концертные залы Значение: 8, на дату 01.12.2020</i>	01.12.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет Министерства культуры Новгородской области от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3 из 8.
1.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	18.01.2020	13.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного тр ансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации " Соглашение Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новгородской области от 13.12.2019г. №054-17-2020-112, приложен файл.
1.1.1	РРП		Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов	18.01.2020	13.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного тр ансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новгородской области от 13.12.2019г. №054-17-2020-112, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.03.2020	28.01.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Иной вид документа Министерства культуры Новгородской области от 28.01.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов	15.03.2020	28.01.2020	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений" Иной вид документа Министерства культуры новгородской области от 28.01.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	10.04.2020	10.04.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.
1.3.1	РРП		Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС	10.04.2020	10.04.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

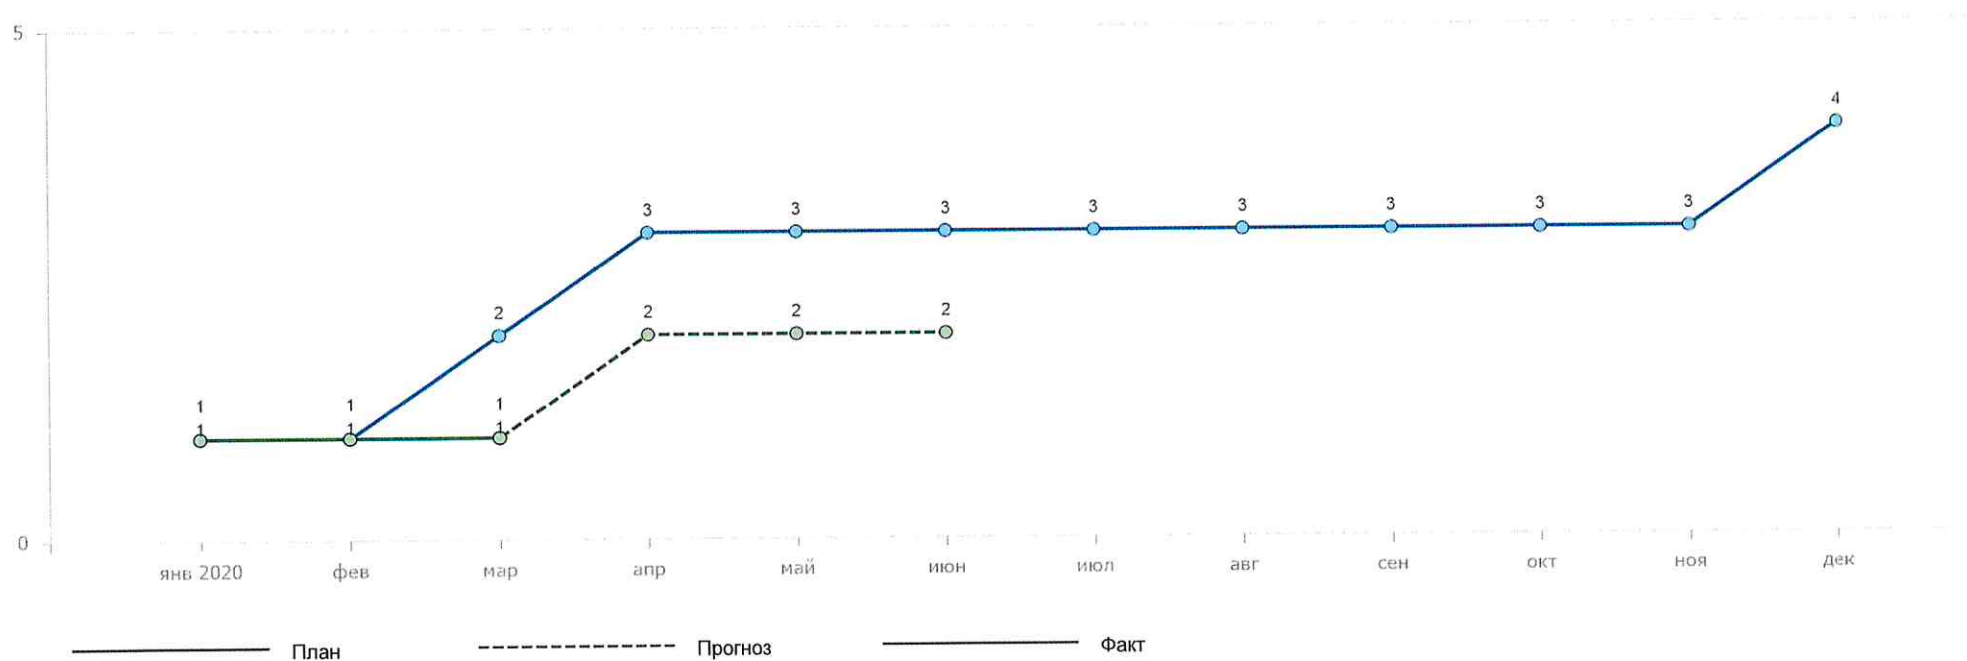


Рис. 1. "(А3-49) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

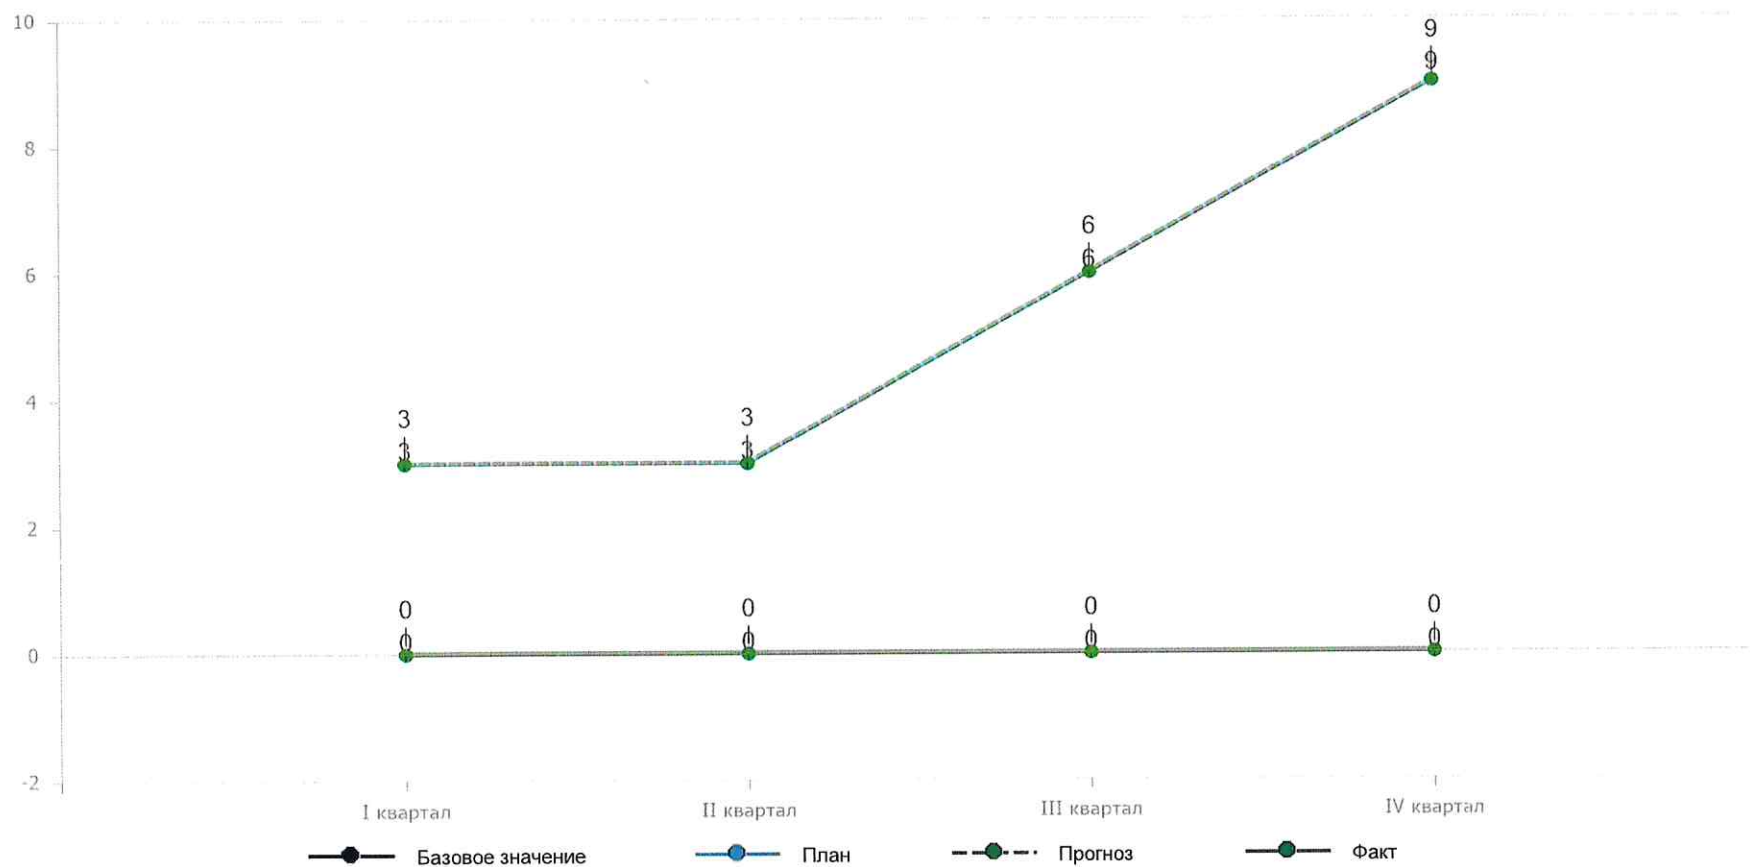


Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов

Диаграмма достижения показателя

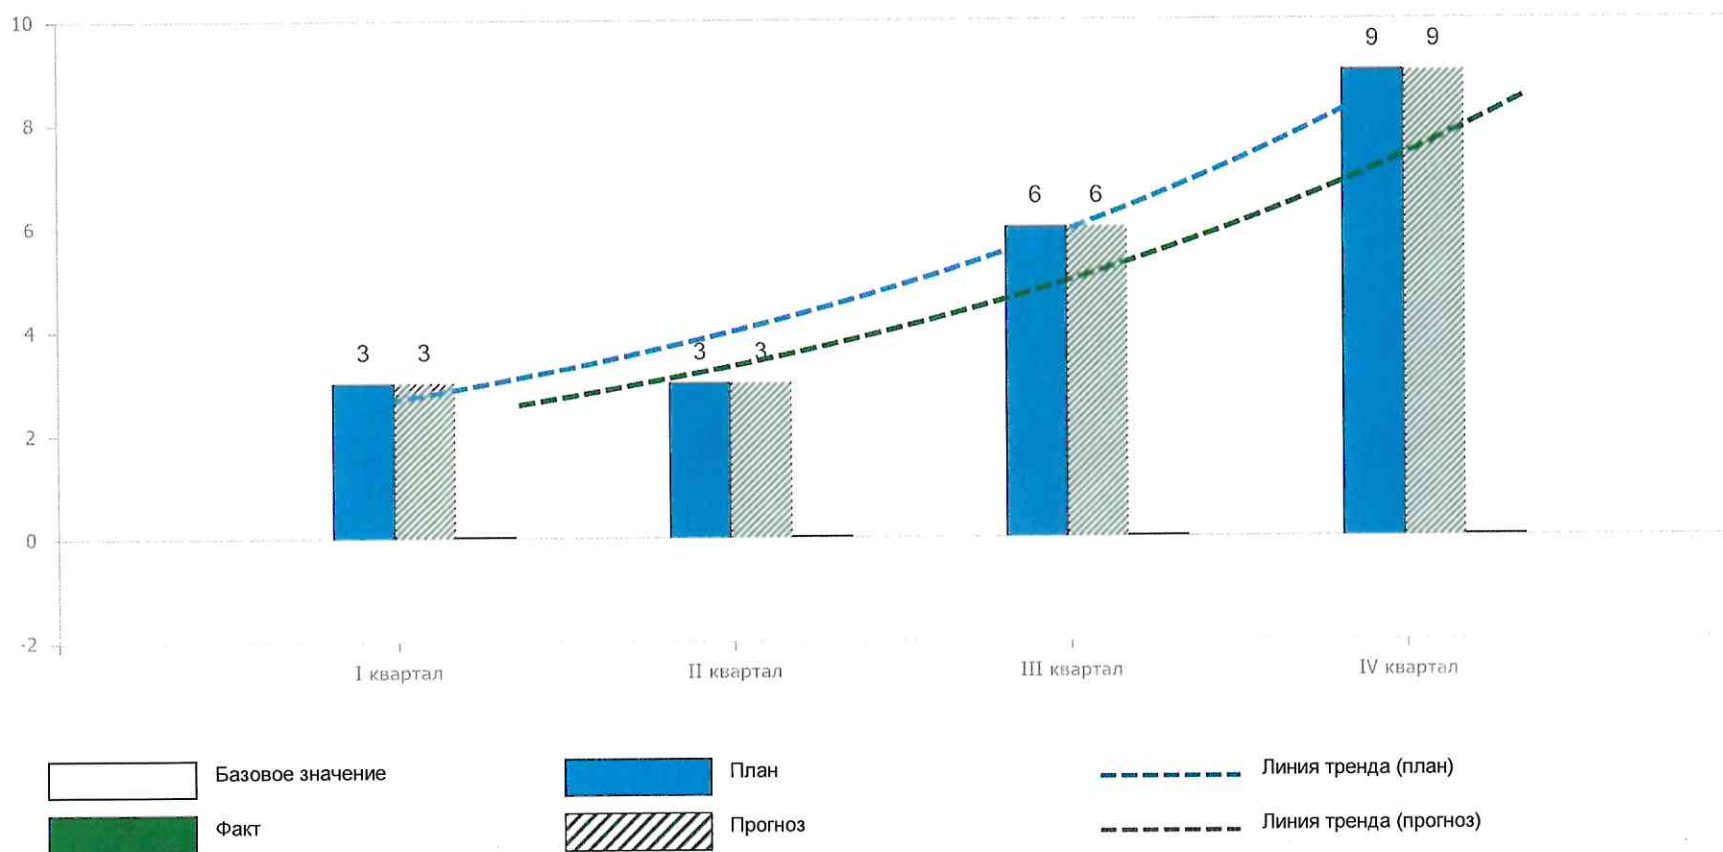


Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов
